

PROGRAMA DE CAMINERÍA RURAL PLAN DE MANTENIMIENTO - SALTO


Acumulado anual a	Diciembre
Año	2019

Detalle	\$
Administración	4.191.872,68
Licitación	43.620.337,85
Mixta	-1.730.150,01

Monto total certificado (\$)	46.082.060,52
Monto total certificado OPP (\$)	32.257.223,89
Monto total certificado Intendencia	13.824.836,63


	Montos Globales	Montos OPP	Montos Intendencia
Total Asignado (\$)	49.367.148,40	34.557.003,88	14.810.144,52
Avance Acumulado (\$)	46.082.060,52	32.257.223,89	13.824.836,63
Saldo Pendiente (\$)	3.285.087,88	2.299.779,99	985.307,89

Avance acumulado Saldo pendiente

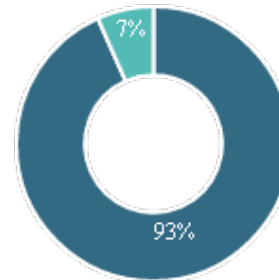

OPP

Avance acumulado Saldo pendiente

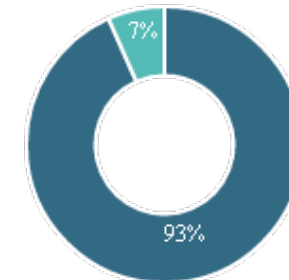

Intendencia

Camino	Mov.Km	tierra y bases (\$)	Obras de arte (\$)	Pavimentación (\$)	Seguridad vial (\$)	Varios (\$)	Leyes Sociales (\$)	Paramétricos (\$)	Transporte (\$)	Total (\$)
UYSA0020	0,0	0,00	1.272.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.366,21
UYSA0038	1,5	654.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.903,89	0,00	144.005,40	819.479,29
UYSA0084	0,0	144.835,20	2.774.671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919.506,47
UYSA0096	39,0	8.786.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.834,32	10.595.444,32
UYSA0144	76,7	13.409.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.392,70	15.536.343,70
UYSA0167	1,6	773.153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.238,42	0,00	0,00	793.391,46
UYSA0178	13,1	2.558.582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.405,51	2.821.987,68
UYSA0183	24,5	12.534.807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579.246,10	9.955.561,65
UYSA0315	4,0	778.844,00	469.238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.897,45	1.367.979,74
Totales	160,4	39.641.353,16	4.516.275,77	0,00	0,00	0,00	41.142,31	0,00	7.041.781,48	46.082.060,52
